

.....

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

จากเงินสะสมของมหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

**โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7**

เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 7/2568 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568


โดยได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2568

.....



รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

1. จำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
จำนวน 100,230,812 บาท
2. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
จำนวน 59,531,368.82 บาท
3. อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดคงเหลือ
จำนวน 2,820,000.00 บาท
4. งบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย
จำนวน 27,399,800.00 บาท
5. งบประมาณคงเหลือหลังดำเนินการ
จำนวน 10,289,643.18 บาท

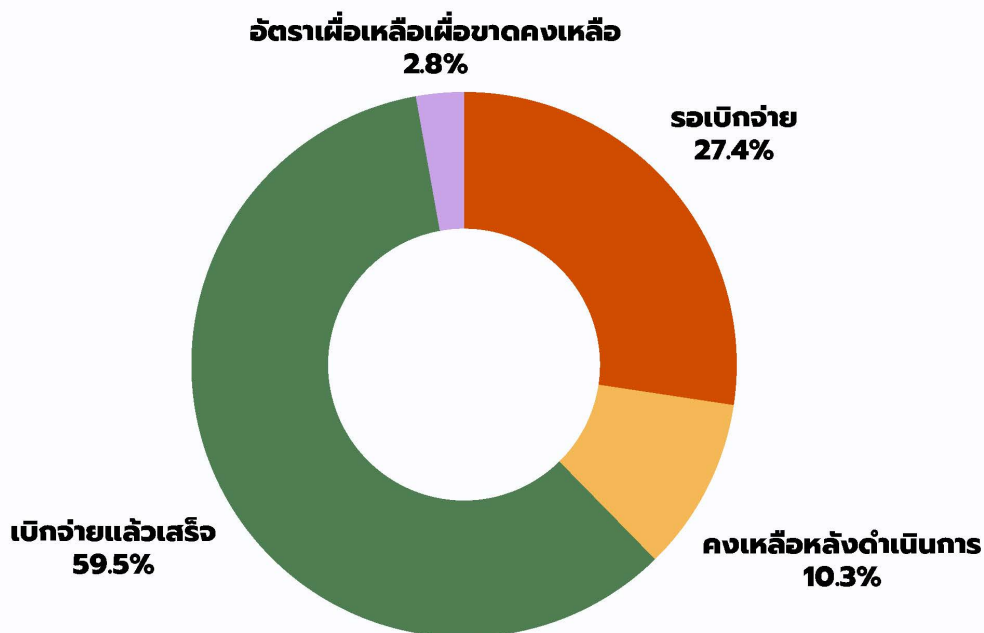

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ


1. รายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 65 รายการ

2. รายการที่ยกเลิก 3 รายการ

- อาคารนิทรรศการดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- อาคาร 6 ชั้น 4 คณะครุศาสตร์
- งานครุภัณฑ์โรงเรียนสาธิต มรวอ.

3. รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 รายการ

- รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบตามสัญญา จำนวน 2 รายการ
- รายการที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 2 จำนวน 2 รายการ
- รายการที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 3 จำนวน 1 รายการ
- รายการรื้อออกแบบปรับปรุง จำนวน 2 รายการ

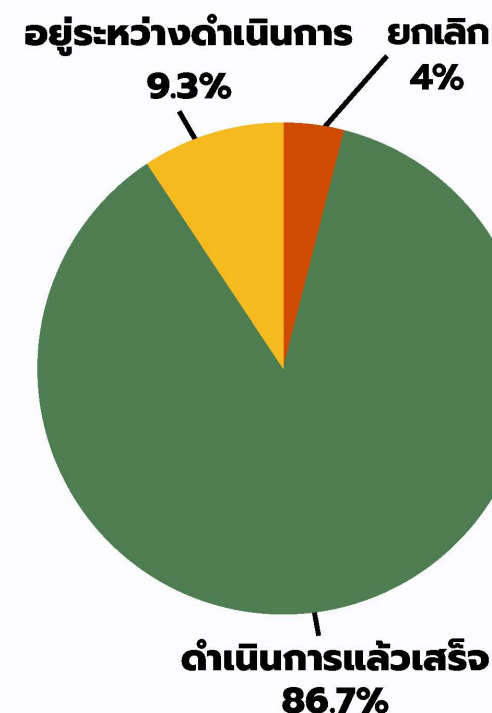

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายละเอียดเอกสารแนบ

รายงานการติดตามเงินสะสมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ที่	รายการ	งวดที่	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	อัตราเผื่อเหลือ เผื่อขาดจำนวน 4,500,000 บาท	รวมงบประมาณ ดำเนินการทั้งสิ้น (บาท)	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว				รายละเอียดความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน	คงเหลือหลัง ดำเนินการ
						วงเงินก่อนนี้ (บาท)	สัญญาและวันที่ ก่อนนี้ผูกพัน	จำนวนการ เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือเบิกจ่าย ตามสัญญา/ยังไม่ ดำเนินการ(บาท)		
โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2567											
1	งานปรับปรุงอาคารคณะและหน่วยงาน	รวม	45,804,070.00	-	45,804,070.00	38,819,439.49		24,227,439.49	14,592,000.00		6,984,630.51
	1.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	รวม	2,400,000.00	-	2,400,000.00	1,890,000.00		1,890,000.00	-		510,000.00
	1.1.1 งานปรับปรุงคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2,400,000 บาท มีรายการปรับปรุงดังนี้		2,400,000.00		2,400,000.00	1,890,000.00	ทก.จ.1/2567	1,890,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	510,000.00
	1.1.1 อาคารสำนักงาน	งวดที่ 1				งบแผ่นดิน	2 ก.ค. 67	งบแผ่นดิน			
	จำนวน 744,556.72 บาท	งวดที่ 2				งบแผ่นดิน		งบแผ่นดิน			
	1.1.2 อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น	งวดที่ 3				งบแผ่นดิน		งบแผ่นดิน			
	จำนวน 386,399.37 บาท	งวดที่ 4			441,000.00			441,000.00			
	1.1.3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา	งวดที่ 5			294,000.00			294,000.00			
	จำนวน 65,806.37 บาท	งวดที่ 6			441,000.00			441,000.00			
	1.1.4 อาคารปฏิบัติการ	งวดที่ 7				714,000.00		714,000.00			
	จำนวน 744,052.42 บาท										
	1.1.5 อาคารห้องปฏิบัติการหมัก										
จำนวน 202,188.44 บาท											
1.1.6 อาคารห้องเบเกอร์รี่											
จำนวน 251,914.60 บาท											
1.1.7 ห้องเพาะเห็ด											
จำนวน 5,082.08 บาท											
(แก้ไขรายการ)											

ที่	รายการ	งวดที่	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	อัตราเผื่อเหลือเพื่อขาดจำนวน 4,500,000 บาท	รวมงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น (บาท)	ก่อนนี้ผู้ผูกพันแล้ว				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน	คงเหลือหลังดำเนินการ
						วงเงินก่อนนี้ (บาท)	สัญญาและวันที่ก่อนนี้ผู้ผูกพัน	จำนวนการเบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือเบิกจ่ายตามสัญญา/ยังไม่ดำเนินการ(บาท)		
	1.2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	รวม	4,242,000.00	-	4,242,000.00	3,900,000.00		3,900,000.00	-		342,000.00
	1.2.1 อาคารปฏิบัติการ 2 (2 ชั้น) จำนวน 317,822.75 บาท		4,242,000.00		4,242,000.00	3,900,000.00	ทอ.จ.3/2567 26 ก.ค. 67	3,900,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	342,000.00
	1.2.2 อาคารปฏิบัติการ 3 (ออกแบบ-เซรามิกส์) จำนวน 1,282,198.21 บาท	งวดที่ 1				390,000.00		390,000.00			
	1.2.3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 247,561.21 บาท	งวดที่ 2				195,000.00		195,000.00			
	1.2.4 อาคารปฏิบัติการ 1 คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม จำนวน 563,883.85 บาท	งวดที่ 3				292,500.00		292,500.00			
	1.2.5 อาคาร 9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1,763,613.94 บาท	งวดที่ 4				487,500.00		487,500.00			
	1.2.6 ครุภัณฑ์ 3 รายการ จำนวน 67,624.00 บาท	งวดที่ 5				195,000.00		195,000.00			
		งวดที่ 6				780,000.00		780,000.00			
		งวดที่ 7				1,560,000.00		1,560,000.00			
	1.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	รวม	2,580,000.00	-	2,580,000.00	2,293,051.49		2,293,051.49	-		286,948.51
	1.3.1 อาคารปฏิบัติการทัศนศิลป์ จำนวน 504,256.18 บาท		2,404,628.25		2,404,628.25	2,293,051.49	มส.จ.3/2567 9 ก.ค. 67	2,293,051.49	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	111,576.76
	1.3.2 อาคาร 8 คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ จำนวน 924,134.75 บาท	งวดที่ 1				171,978.86		171,978.86			
	1.3.3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 34,364.13 บาท	งวดที่ 2				171,978.86		171,978.86			
	1.3.4 หลังคาหน้าอาคารกิจการนักศึกษา จำนวน 70,371.75 บาท	งวดที่ 3				286,631.44		286,631.44			
	1.3.5 ห้องปฏิบัติการดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ ศึกษาจำนวน 871,553.90 บาท	งวดที่ 4				286,631.44		286,631.44			
		งวดที่ 5				229,305.15		229,305.15			
		งวดที่ 6				343,957.72		343,957.72			

ที่	รายการ	งวดที่	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	อัตราเผื่อเหลือเพื่อขาดจำนวน 4,500,000 บาท	รวมงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น (บาท)	ก่อนนี้ผู้ผูกพันแล้ว				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน	คงเหลือหลังดำเนินการ
						วงเงินก่อนนี้ (บาท)	สัญญาและวันที่ก่อนนี้ผู้ผูกพัน	จำนวนการเบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือเบิกจ่ายตามสัญญา/ยังไม่ดำเนินการ(บาท)		
		งวดที่ 7				802,568.02		802,568.02			
	1.3.6 อาคารนิทรรศการดนตรี(ยกเล็ก) จำนวน 175,371.75 บาท		175,371.75		175,371.75					หน่วยงานดำเนินการเองเรียบร้อยแล้ว	175,371.75
	1.4 คณะวิทยาการจัดการ	รวม	1,620,000.00	-	1,620,000.00	1,290,000.00		1,290,000.00	-		330,000.00
	1.4.1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ		1,620,000.00		1,620,000.00	1,290,000.00	วจก.จ3/2567 19 ก.ค. 67	1,290,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	330,000.00
		งวดที่ 1				129,000.00		129,000.00			
		งวดที่ 2				322,500.00		322,500.00			
		งวดที่ 3				838,500.00		838,500.00			
	1.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 19,200 บาท	รวม	2,308,200.00	-	2,308,200.00	2,000,000.00		2,000,000.00	-		308,200.00
	1.5.1 อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ จำนวน 19,200 บาท		2,308,200.00		2,308,200.00	2,000,000.00	วท.จ.2/2567 9 ส.ค. 67	2,000,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	308,200.00
		งวดที่ 1				200,000.00		200,000.00			
		งวดที่ 2				300,000.00		300,000.00			
		งวดที่ 3				200,000.00		200,000.00			
		งวดที่ 4				300,000.00		300,000.00			
		งวดที่ 5				400,000.00		400,000.00			
		งวดที่ 6				600,000.00		600,000.00			
	1.6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1,335,000 บาท		-	-	-	-		-	-		-
	1.6.1 อาคารคหกรรมศาสตร์ จำนวน 758,713.00 บาท 1.6.2 อาคาร 5 จำนวน 576,596.30 บาท						วท.จ.2/2567 9 ส.ค. 67			เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	1.7 วิทยาลัยนวัตถกรรม จำนวน 954,000 บาท		-	-	-	-		-	-		
	1.7.1 อาคารวิทยาลัยนวัตถกรรมการจัดการ จำนวน 654,808.68 บาท						วท.จ.2/2567 9 ส.ค. 67			เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	

ที่	รายการ	งวดที่	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	อัตราเผื่อเหลือ เพื่อขาดจำนวน 4,500,000 บาท	รวมงบประมาณ ดำเนินการทั้งสิ้น (บาท)	ก่อนนี้ผู้ผูกพันแล้ว				รายละเอียดความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน	คงเหลือหลัง ดำเนินการ
						วงเงินก่อนนี้ (บาท)	สัญญาและวันที่ ก่อนนี้ผู้ผูกพัน	จำนวนการ เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือเบิกจ่าย ตามสัญญา/ยังไม่ ดำเนินการ(บาท)		
	1.7.2 งานครุภัณฑ์ จำนวน 299,600.00 บาท										
	1.8 คณะครูศาสตร์	รวม	18,321,004.00	-	18,321,004.00	17,079,000.00		2,487,000.00	14,592,000.00		1,242,004.00
	1.8.1 อาคาร 6 ชั้น 4 (ยกเล็ก) จำนวน 195,000 บาท		195,000.00		195,000.00					หน่วยงานดำเนินการเองเรียบร้อยแล้ว	195,000.00
	1.8.2 ปรับปรุงระประปาและห้องน้ำ อาคาร 6 และอาคาร 7 จำนวน 2,638,396.00 บาท		2,638,396.00		2,638,396.00	2,487,000.00	คศ.จ.2/2567 23 ก.ย. 67	2,487,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	151,396.00
		งวดที่ 1				621,750.00		621,750.00			
		งวดที่ 2				621,750.00		621,750.00			
		งวดที่ 3				373,050.00		373,050.00			
		งวดที่ 4				870,450.00		870,450.00			
	1.8.3 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ยิมเนเซียม 1 จำนวน 11,218,108 บาท (แก้ไขรายการ)		11,218,608.00		11,218,608.00	11,200,000.00	คศ.ช.1/2568 21 ม.ค. 68		11,200,000.00	ระยะเวลา 120 วัน เริ่มงานวันที่ 21 ม.ค. 68 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 พ.ค. 68 (เดิม) ขยายระยะเวลาออกไปอีก 125 วัน จากสัญญาจ้างเดิมเป็น สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 ก.ย. 68 (ใหม่) เนื่องจากการประกวดราคาปรับปรุง อาคารยิมเนเซียม มีผู้อุทธรณ์ซึ่งอยู่ ระหว่างการพิจารณาผลของผู้ อุทธรณ์นั้น จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถ เข้าดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ดังนั้น กกก.จึงมีมติเห็นชอบให้มี การขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้ขายให้	18,608.00

ที่	รายการ	งวดที่	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	อัตราเผื่อเหลือเพื่อขาดจำนวน 4,500,000 บาท	รวมงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น (บาท)	ก่อนนี้ผู้ผูกพันแล้ว				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน	คงเหลือหลังดำเนินการ
						วงเงินก่อนนี้ (บาท)	สัญญาและวันที่ก่อนนี้ผูกพัน	จำนวนการเบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือเบิกจ่ายตามสัญญา/ยังไม่ดำเนินการ(บาท)		
	1.8.4 งานปรับปรุงอาคารยิมเนเซียม 1 จำนวน 4,269,000 บาท (แก้ไขรายการ)		4,269,000.00		4,269,000.00	3,392,000.00	คศ.จ. 2/2568 10 มิ.ย. 68		3,392,000.00	ระยะเวลา 90 วัน เริ่มงานวันที่ 11 มิ.ย. 68 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 ก.ย. 68	877,000.00
	1.8.5 ค่าออกแบบงานปรับปรุงอาคารยิมเนเซียม 1 จำนวน 190,000 บาท (รายการใหม่)			190,000.00	190,000.00	190,000.00	คศ.จ. 1/2567 9 ส.ค. 67	190,000.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	-
	1.9 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จำนวน 412,000 บาท	รวม	2,910,168.00	-	2,910,168.00	2,340,000.00		2,340,000.00	-		570,168.00
	1.9.1 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จำนวน 412,000 บาท		2,910,168.00		2,910,168.00	2,340,000.00	จ.56/2567 13 ส.ค. 67	2,340,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	570,168.00
		งวดที่ 1				234,000.00		234,000.00			
		งวดที่ 2				585,000.00		585,000.00			
		งวดที่ 3				468,000.00		468,000.00			
		งวดที่ 4				468,000.00		468,000.00			
		งวดที่ 5				585,000.00		585,000.00			
	1.10 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี	รวม	4,185,277.00	-	4,185,277.00	3,573,500.00		3,573,500.00	-		611,777.00
	1.10.1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ						จ.56/2567 13 ส.ค. 67			เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	1.10.2 ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน 4,185,277.00 บาท ประกอบด้วย		4,185,277.00		4,185,277.00	3,573,500.00		3,573,500.00	-		
	1.10.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 28 เครื่อง จำนวน 1,230,500 บาท		1,230,500.00		1,230,500.00	1,123,500.00	ช.6/2567 24 มิ.ย. 67	1,123,500.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	107,000.00
	1.10.2.1 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 39 เครื่อง จำนวน 2,954,777 บาท		2,954,777.00		2,954,777.00	2,450,000.00	ช.4/2568 20 พ.ย. 67	2,450,000.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	504,777.00

ที่	รายการ	งวดที่	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	อัตราเมื่อเหลือ เพื่อขาดจำนวน 4,500,000 บาท	รวมงบประมาณ ดำเนินการทั้งสิ้น (บาท)	ก่อนนี้ผู้ผูกพันแล้ว				รายละเอียดความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน	คงเหลือหลัง ดำเนินการ
						วงเงินก่อนนี้ (บาท)	สัญญาและวันที่ ก่อนนี้ผู้ผูกพัน	จำนวนการ เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือเบิกจ่าย ตามสัญญา/ยังไม่ ดำเนินการ(บาท)		
	1.11 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	รวม	7,237,421.00	-	7,237,421.00	4,453,888.00		4,453,888.00	-		2,783,533.00
	1.11.1 ทาสีอาคารภายนอก อาคารเรียนโรงเรียน สาธิตประถม จำนวน 1,500,000.00 บาท (แก้ไขรายการ)		1,500,000.00		1,500,000.00	585,000.00	จ.66/2567	585,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	915,000.00
		งวดที่ 1				146,250.00	4 ก.ย. 67	146,250.00			
		งวดที่ 2				175,500.00		175,500.00			
		งวดที่ 3				263,250.00		263,250.00			
	1.11.2 ปรับปรุงโรงเรียนสาธิตมัธยม จำนวน 2,170,000.00 บาท (แก้ไขรายการ)		2,170,000.00		2,170,000.00	1,888,888.00	จ.67/2567 4 ก.ย. 67	1,888,888.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	281,112.00
		งวดที่ 1				188,888.80		188,888.80			
		งวดที่ 2				283,333.20		283,333.20			
		งวดที่ 3				283,333.20		283,333.20			
		งวดที่ 4				188,888.80		188,888.80			
		งวดที่ 5				944,444.00		944,444.00			
	1.11.3 ปรับปรุงห้องวิชาการโรงเรียนสาธิตมัธยม จำนวน 3,174,591.00 บาท (แก้ไขรายการ)		3,174,591.00		3,174,591.00	1,980,000.00	จ.102/2567 23 ก.ย. 67	1,980,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	1,194,591.00
		งวดที่ 1				396,000.00		396,000.00			
		งวดที่ 2				495,000.00		495,000.00			
		งวดที่ 3				1,089,000.00		1,089,000.00			
	1.11.4 จัดซื้อครุภัณฑ์จอร์บบัสสัมผัส (Interactive) ขนาด 86 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (ยกเลิก) จำนวน 392,690 บาท		392,690.00		392,690.00				-	ไม่ผ่านการพิจารณาจากทาง มหาวิทยาลัย	392,690.00
2	งานปรับปรุงส่วนกลาง	รวม	33,908,601.00	800,000.00	34,708,601.00	21,082,315.33		19,918,762.33	12,807,800.00		1,982,038.67
	2.1 ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน ที่วีขนาดจอ 75 นิ้ว 100 เครื่อง พร้อมขาตั้งแบบมีล้อ		3,210,000.00		3,210,000.00	2,450,000.00	ช.13/2567 24 ก.ย. 67	2,450,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	760,000.00
	2.2 การพัฒนาสู่การเป็น Digital University ประกอบด้วย		6,000,000.00		6,000,000.00	5,643,500.00		5,643,500.00	-		356,500.00

ที่	รายการ	งวดที่	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	อัตราเผื่อเหลือเพื่อขาดจำนวน 4,500,000 บาท	รวมงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น (บาท)	ก่อนนี้ผู้ผูกพันแล้ว				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน	คงเหลือหลังดำเนินการ
						วงเงินก่อนนี้ (บาท)	สัญญาและวันที่ก่อนนี้ผูกพัน	จำนวนการเบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือเบิกจ่ายตามสัญญา/ยังไม่ดำเนินการ(บาท)		
	2.2.1 จัดหาสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (Microsoft License) 1 งาน 1,500,000 บาท					1,740,000.00	ซ.9/2567 27 ส.ค. 67	1,740,000.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	2.2.2 จัดหาสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (Office 365 A3 for Faculty) 1 งาน 500,000 บาท										
	2.2.3 ปรับปรุงระบบเครือข่าย เดินสายแลนอาคาร SLB 1 งาน 500,000 บาท					472,000.00	จ.48/2567 12 ก.ค. 67	472,000.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	2.2.4 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แบบที่ 1 จำนวน 28 เครื่อง					674,100.00	ซ.6/2567 24 มิ.ย. 67	674,100.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	2.2.5 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง					59,920.00		59,920.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	2.2.6 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แบบที่ 3 จำนวน 30 เครื่อง					706,200.00		706,200.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	2.2.7 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แบบที่ 4 จำนวน 60 เครื่อง					1,502,280.00		1,502,280.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	2.2.8 จัดหาระบบ Network Monitoring 1 งาน 500,000 บาท					489,000.00	ซ.5/2567 24 มิ.ย. 67	489,000.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	2.3 ปรับปรุงแก้ไขอาคารเรียนรวมสังคมาศศาสตร์		314,000.00		314,000.00	282,548.29	ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง	282,548.29	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	31,451.71
	2.4 ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์		99,000.00		99,000.00	94,916.30		94,916.30	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	4,083.70
	2.5 ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ Learning Space		165,800.00		165,800.00	160,500.00		160,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	5,300.00
	2.6 ซ่อมแซมหลังคาโรงยิม 3		50,000.00		50,000.00	49,220.00		49,220.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	780.00
	2.7 งานปรับปรุงต่อเติมอาคารโมเดิร์นเทรด		2,626,000.00		2,626,000.00	2,490,000.00	จ.50/2567 15 ก.ค. 67	2,490,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	136,000.00
		งวดที่ 1				373,500.00		373,500.00			
		งวดที่ 2				373,500.00		373,500.00			
		งวดที่ 3				622,500.00		622,500.00			
		งวดที่ 4				1,120,500.00		1,120,500.00			

ที่	รายการ	งวดที่	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	อัตราเผื่อเหลือเพื่อขาดจำนวน 4,500,000 บาท	รวมงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น (บาท)	ก่อนนี้ผู้ผูกพันแล้ว				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน	คงเหลือหลังดำเนินการ
						วงเงินก่อนนี้ (บาท)	สัญญาและวันที่ก่อนนี้ผูกพัน	จำนวนการเบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือเบิกจ่ายตามสัญญา/ยังไม่ดำเนินการ(บาท)		
	2.8 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมอาคารโมเดิร์นเทรด		957,411.00		957,411.00	853,000.00	จ. 22/2568 3 ก.พ. 68	853,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	104,411.00
		งวดที่ 1				341,200.00		341,200.00			
		งวดที่ 2				511,800.00		511,800.00			
	2.9 Fire control Panel อาคาร 100 ปี		342,143.00		342,143.00	330,610.74	ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง	330,610.74	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	11,532.26
	2.10 กล้องวงจรปิด (อาคาร 100 ปี, อาคารเรียนรวมสังคมนาตร์, อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์)		1,000,000.00		1,000,000.00	984,400.00	ช.14/2567 2 ต.ค. 67	984,400.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	15,600.00
	2.11 ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ 1 ระบบ (แก้ไขรายการ) *บันทึกแก้ไขรายการและของงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของการปรับปรุง		2,696,400.00		2,696,400.00				2,696,400.00	ล่าช้าเนื่องจากขอการปรับปรุงอาคารหอประชุมให้แล้วเสร็จก่อน	
	2.19 จ้างออกแบบงานปรับปรุงหอประชุมวไลยอลงกรณ์ 1 งาน (รายการใหม่)			400,000.00	400,000.00	400,000.00	จ.11/2568 24 ธ.ค. 67	120,000.00	280,000.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 2	
		งวดที่ 1				120,000.00		120,000.00			
		งวดที่ 2							160,000.00		
		งวดที่ 3							120,000.00		
	2.20 จ้างออกแบบงานปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารเรียนรวมเอนกประสงค์พร้อมสวนขยาย (รายการใหม่)			400,000.00	400,000.00	400,000.00	จ.18/2568 27 ม.ค. 68	120,000.00	280,000.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดสุดท้าย	
		งวดที่ 1						120,000.00			
		งวดที่ 2							280,000.00		
	2.12 ไฟสนามกีฬา		500,000.00		500,000.00	498,620.00	ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง	498,620.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	1,380.00

ที่	รายการ	งวดที่	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	อัตราเมื่อเหลือ เพื่อขาดจำนวน 4,500,000 บาท	รวมงบประมาณ ดำเนินการทั้งสิ้น (บาท)	ก่อนนี้ผู้ผูกพันแล้ว				รายละเอียดความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน	คงเหลือหลัง ดำเนินการ
						วงเงินก่อนนี้ (บาท)	สัญญาและวันที่ ก่อนนี้ผู้ผูกพัน	จำนวนการ เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือเบิกจ่าย ตามสัญญา/ยังไม่ ดำเนินการ(บาท)		
	2.13 ปรับปรุงตกแต่งภายใน 60 ปี วไลยอลงกรณ์		7,500,000.00		7,500,000.00				7,500,000.00	สรุปงานออกแบบและสิ่งของที่ นำมาจัดแสดงที่หอเกียรติประวัติ 2 ชั้น คือชุดเสวยและแทมลงพระนาม ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2520	
	2.14 อนุรักษ์ระบบภาพและเสียง ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัย 1 ระบบ		1,447,847.00		1,447,847.00			1,447,847.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	2.15 จัดหารถตู้		3,000,000.00		3,000,000.00	2,790,000.00	ช.8/2567 16 ก.ค. 67	2,790,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	210,000.00
	2.16 ปรับปรุงรถบัส 40-0654 ปทุมธานี		500,000.00		500,000.00	499,000.00	จ.115/2567 24 ก.ย. 67	499,000.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	1,000.00
	2.18 ปรับปรุงอาคารหอประชุมวไลยอลงกรณ์ ศูนย์ กทม.		3,500,000.00		3,500,000.00	3,156,000.00	จ.32/2568 24 มี.ค.68	1,104,600.00	2,051,400.00	จำนวน 75 วัน จำนวน 4 งวดงาน เริ่มวันที่ 8 เม.ย 68 - 21 มิ.ย. 68 ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3	344,000.00
		งวดที่ 1				473,400.00		473,400.00			
		งวดที่ 2				631,200.00		631,200.00			
		งวดที่ 3				946,800.00			946,800.00		
		งวดที่ 4				1,104,600.00			1,104,600.00		
3	ศูนย์สระแก้ว	รวม	14,756,830.00	690,000.00	15,446,830.00	14,123,856.00		14,123,856.00	-		1,322,974.00
	3.1 ก่อสร้างหลังคาคลุมเนกประสงค์ (ราคากลางจากฝ่ายอาคารก่อน e-bidding 2,695,000)		2,108,000.00	237,000.00	2,345,000.00	2,142,000.00	จ.58/2567 22 ส.ค. 67	2,142,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	203,000.00
		งวดที่ 1				214,200.00		214,200.00			
		งวดที่ 2				535,500.00		535,500.00			
		งวดที่ 3				214,200.00		214,200.00			
		งวดที่ 4				428,400.00		428,400.00			

ที่	รายการ	งวดที่	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	อัตราเผื่อเหลือเพื่อขาดจำนวน 4,500,000 บาท	รวมงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น (บาท)	ก่อนนี้ผู้ผูกพันแล้ว				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน	คงเหลือหลังดำเนินการ
						วงเงินก่อนนี้ (บาท)	สัญญาและวันที่ก่อนนี้ผูกพัน	จำนวนการเบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือเบิกจ่ายตามสัญญา/ยังไม่ดำเนินการ(บาท)		
		งวดที่ 5				749,700.00		749,700.00			
3.2 ต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา จำนวน 670,000 บาท 3.3 ปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการ จำนวน 414,000 บาท 3.4 ปรับปรุงต่อเติมบ้านพักรับรองอาจารย์ จำนวน 905,000 บาท			1,989,000.00		1,989,000.00	1,599,000.00	จ.61/2567 22 ส.ค. 67	1,599,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	390,000.00
		งวดที่ 1				159,900.00		159,900.00			
		งวดที่ 2				239,850.00		239,850.00			
		งวดที่ 3				319,800.00		319,800.00			
		งวดที่ 4				399,750.00		399,750.00			
		งวดที่ 5				479,700.00		479,700.00			
3.5 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับจอดรถยนต์			1,300,000.00		1,300,000.00	1,115,500.00	จ.60/2567 22 ส.ค. 67	1,115,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	184,500.00
		งวดที่ 1				278,875.00		278,875.00	-		
		งวดที่ 2				390,425.00		390,425.00	-		
		งวดที่ 3				446,200.00		446,200.00	-		
3.6 โรงจอดรถส่วนกลาง			587,000.00	453,000.00	1,040,000.00	918,000.00	จ.59/2567 22 ส.ค. 67	918,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	122,000.00
		งวดที่ 1				183,600.00		183,600.00			
		งวดที่ 2				321,300.00		321,300.00			
		งวดที่ 3				413,100.00		413,100.00			
3.7 ปรับปรุงอาคารอำนวยการ จำนวน 2,339,000 บาท 3.8 ติดตั้งรั้วศูนย์สระแก้ว (2 ชุด) จำนวน 300,000 บาท			2,639,000.00		2,639,000.00	2,489,500.00	จ.63/2567 22 ส.ค. 67 11 ต.ค. 67	2,489,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	149,500.00
		งวดที่ 1				174,265.00		174,265.00			
		งวดที่ 2				248,950.00		248,950.00			
		งวดที่ 3				373,425.00		373,425.00			
		งวดที่ 4				448,110.00		448,110.00			
		งวดที่ 5				622,375.00		622,375.00			
		งวดที่ 6				622,375.00		622,375.00			
3.9 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 จำนวน 2,037,000 บาท			3,729,000.00		3,729,000.00	3,499,000.00	จ.62/2567 22 ส.ค. 67	3,499,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	230,000.00

ที่	รายการ	งวดที่	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดจำนวน 4,500,000 บาท	รวมงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น (บาท)	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน	คงเหลือหลังดำเนินการ
						วงเงินก่อนนี้ (บาท)	สัญญาและวันที่ก่อนนี้ผูกพัน	จำนวนการเบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือเบิกจ่ายตามสัญญา/ยังไม่ดำเนินการ(บาท)		
	3.10 ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1,692,000 บาท	งวดที่ 1				524,850.00		524,850.00			
		งวดที่ 2				524,850.00		524,850.00			
		งวดที่ 3				699,800.00		699,800.00			
		งวดที่ 4				699,800.00		699,800.00			
		งวดที่ 5				1,049,700.00		1,049,700.00			
	3.11 ครุภัณฑ์บริหารสำนักงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างรายได้		170,000.00		170,000.00	170,000.00		170,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	-
	3.12 ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาและบริหารสำนักงาน		394,830.00		394,830.00	392,966.00		392,966.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	1,864.00
	3.13 ปรับปรุงหอพระและภูมิทัศน์โดยรอบ		530,000.00		530,000.00	488,000.00	จ. 25/2568	488,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	42,000.00
		งวดที่ 1				195,200.00	18 ก.พ. 2568	195,200.00			
		งวดที่ 2				292,800.00		292,800.00			
	3.14 หม้อแปลงไฟฟ้า		350,000.00		350,000.00	349,890.00		349,890.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	110.00
	3.15 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนสาธิตปฐมวัย และห้องแปรรูปขนมไหม้อีรี่		660,000.00		660,000.00	660,000.00		660,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	-
	3.16 ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้		300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	-
4	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	รวม	1,261,311.00		1,261,311.00	1,261,311.00		1,261,311.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
รวมทั้งสิ้น			95,730,812.00	1,490,000.00	97,220,812.00	79,786,921.82		59,531,368.82	27,399,800.00		10,289,643.18

หมายเหตุ

1. จำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 100,230,812 บาท
2. งบประมาณรายการที่ยกเลิกรายการ จำนวน 763,061.75 บาท
3. อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดจำนวน 4,500,000 บาท โอนไปกิจกรรมอื่น 1,680,000 บาท คงเหลือ 2,820,000 บาท
4. ชื่องรายการ อักษรสีแดง เป็นรายการที่ขอยกเลิก และ อักษรสีน้ำเงิน เป็นรายการที่ขอแก้ไขชื่องรายการและรายการใหม่
